



ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Doküman No	
İlk Yayın Tarihi	01.07.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/3

İŞİN ADI

TOPLAM SÜRE

Sözleşme Sonrası Yapım İhalesi Kontrol Süreci

Sözleşmede Belirtilir.

SORUMLULAR

İŞ AKIŞI

BAŞLANGIÇ

Daire Başkanlığı
Yüklenici Firma

İhale Uhdesinde Kalan Firma ile İdare Arasında
Sözleşme İmzalanır.

T.İşler Şube Müdürlüğü
Daire Başkanlığı
Yapı Denetim Heyeti

Sözleşmenin İmzalanmasını Müteakip, Şube Müdürünün
Teklifi ve Daire Başkanlığı Makamının Onayı ile Başkan
ve Üyelerden Oluşan 'Yapı Denetim Heyeti' Oluşturulur.

Yapı Denetim Heyeti

Oluşturulan Yapı Denetim Heyeti'ne Görevleri Tebliğ
Edilir.

Yapı Denetim Heyeti
Yüklenici Firma

Yapı Denetim Heyeti Tarafından Sözleşmede Belirtilen
Süre İçerisinde Yüklenici Firmaya Yer Teslimi Yapılır.
İşe Başlama Zaptı Tutulur.

Yüklenici Firma

Yüklenici Firmadan, Sözleşme ve Mevzuatta Belirtilen
Esaslar Dahilinde, Belirtilen Süre İçerisinde Şantiye
Alanı ve Yapılacak İşler İçin All Risk Sigortasının
Yapılması, Sözleşmede Belirtilen Teknik Personellere Ait
Noter Onaylı Taahhütnamelerin ve Ödenek Dilimleri ve
İmalatların Yapım Planlamasına Göre İş Programının
İdareye Dilekçe ile Sunulması İstenir.

Yüklenici Firmaya yazılı bildirim
yapılarak Sözleşme ve Mevzuatta
Belirtilen Esaslar Dahilinde, Belirtilen
Süre İçerisinde Şantiye Alanı ve
Yapılacak İşler İçin All Risk
Sigortasının Yapılması, Sözleşmede
Belirtilen Teknik Personellere Ait
Noter Onaylı Taahhütnamelerin, İş
Programının Hata ve Eksikliklerin
Giderilerek Tekrar Sunulması Talep
Edilir.

Yüklenici Firma
Teknik İşler Şube Müdürü
Bakım Onarım Şube
Müdürü

All Risk Sigortası, Teknik Personel Taahhütnameleri ve İş
Programı Eksiksiz Olarak Sunulmuş Mu?

(H)

Daire Başkanı

Yüklenici Tarafından Sunulan Belgeler ve İş Programı
Daire Başkanlığı Makamının Onayına Sulunur.

(2)

Hazırlayan
Teknik İşler Şube Müdürü / Bakım Onarım Şube Müdürü

Sistem Onayı
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı
Daire Başkanı



ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Doküman No	
İlk Yayın Tarihi	01.07.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	2/3

İŞİN ADI


TOPLAM SÜRE

Sözleşme Sonrası Yapım İhalesi Kontrol Süreci

Sözleşmede Belirtilir.

SORUMLULAR

İŞ AKIŞI

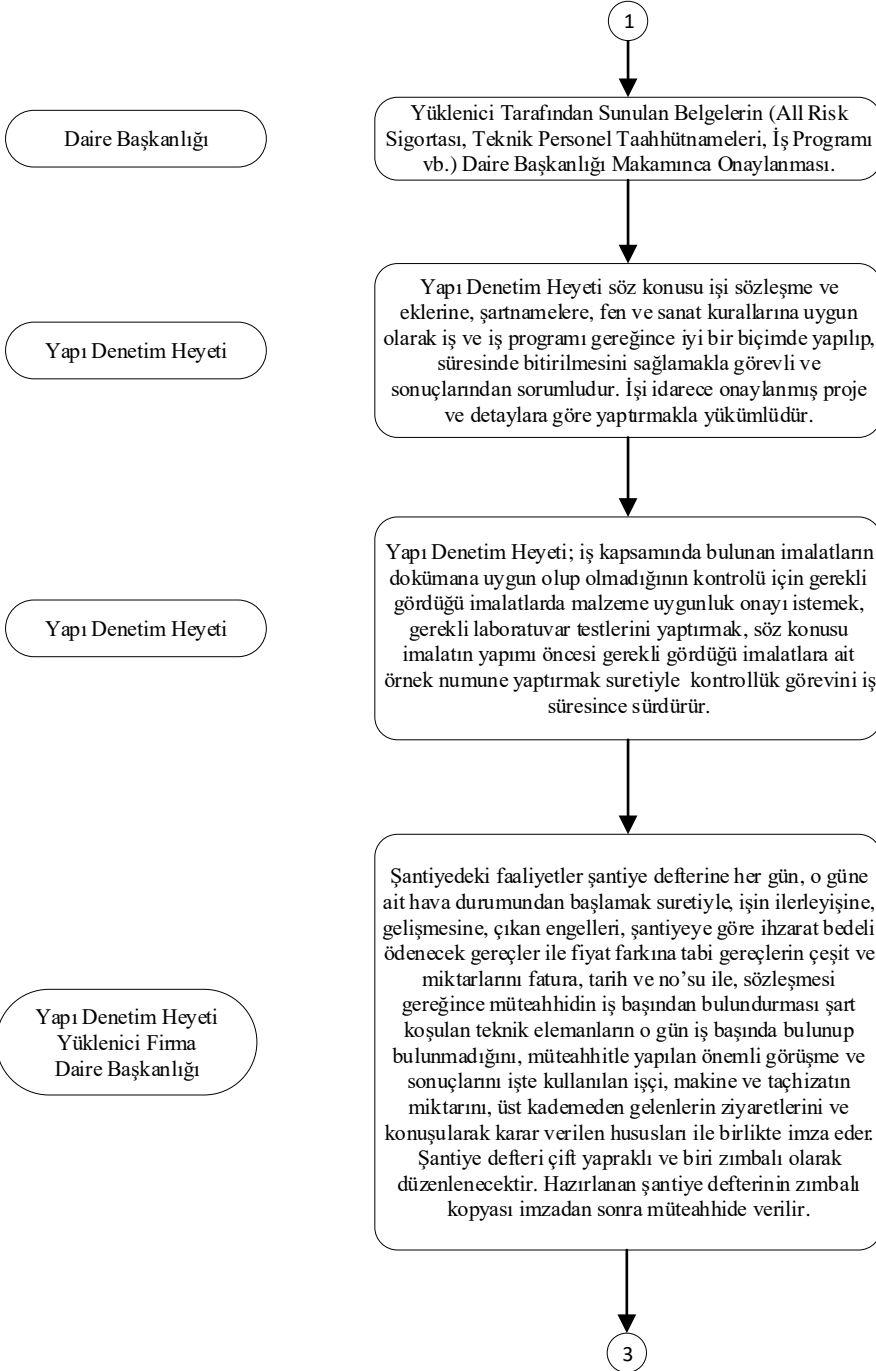

Hazırlayan
Teknik İşler Şube Müdürü / Bakım Onarım Şube Müdürü

Sistem Onayı
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı
Daire Başkanı



ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Doküman No	
İlk Yayın Tarihi	01.07.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	3/3

İŞİN ADI


TOPLAM SÜRE

Sözleşme Sonrası Yapım İhalesi Kontrol Süreci

Sözleşmede Belirtilir.

SORUMLULAR

İŞ AKIŞI

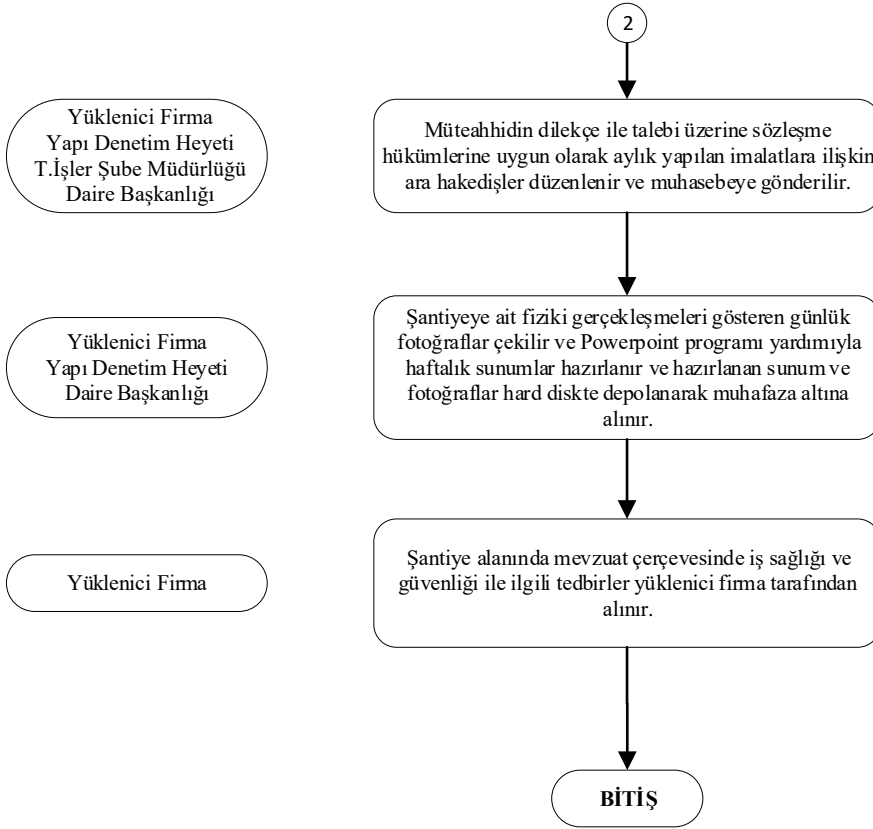

Hazırlayan
Teknik İşler Şube Müdürü / Bakım Onarım Şube Müdürü

Sistem Onayı
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı
Daire Başkanı
